


| Id | Opgavetitel/Opgavenavn | Varighed | Startdato | Slutdato |
|----|--|----------|-------------|-------------|
| 1 | TYRENS - Afløbs projekt, Dræn af sø | | | |
| 2 | Kontrahering | 1 dag | ma 03-06-19 | ma 03-06-19 |
| 3 | LER og Gravetilladelse | 8 dage | ti 11-06-19 | to 20-06-19 |
| 4 | Etablering af byggeplads | 2 dage | ti 25-06-19 | on 26-06-19 |
| 5 | Gravearbejder gruber og frigravning af gas | 3 dage | to 27-06-19 | ma 01-07-19 |
| 6 | Rydde til adgangsvej | 1 dag | ti 02-07-19 | ti 02-07-19 |
| 7 | Udlægning af Jærplader | 1 dag | on 03-07-19 | on 03-07-19 |
| 8 | Levering af Bygværk | 1 dag | to 04-07-19 | to 04-07-19 |
| 9 | Levering og svejsning af PE-rør ø160mm | 3 dage | fr 05-07-19 | ti 09-07-19 |
| 10 | Styret boring | 2 dage | on 10-07-19 | to 11-07-19 |
| 11 | Placering af spuns | 2 dage | fr 12-07-19 | ma 15-07-19 |
| 12 | Gravearbejder for bygværk | 3 dage | ti 16-07-19 | to 18-07-19 |
| 13 | Fundering til bygværk | 3 dage | fr 19-07-19 | ti 23-07-19 |
| 14 | Placering af bygværk | 1 dag | on 24-07-19 | on 24-07-19 |
| 15 | Montering af PE-rør i bygværk | 1 dag | to 25-07-19 | to 25-07-19 |
| 16 | Rustfri stålplade + net bygværk | 1 dag | fr 26-07-19 | fr 26-07-19 |
| 17 | Retablering omkring bygværk | 3 dage | ma 29-07-19 | on 31-07-19 |
| 18 | Retablering ved brønd startgrube | 4 dage | to 01-08-19 | ti 06-08-19 |
| 19 | TVI af dræn rør | 1 dag | on 07-08-19 | on 07-08-19 |
| 20 | Fejl og mangler | 5 dage | to 08-08-19 | on 14-08-19 |
| 21 | Afføring | 1 dag | to 15-08-19 | to 15-08-19 |

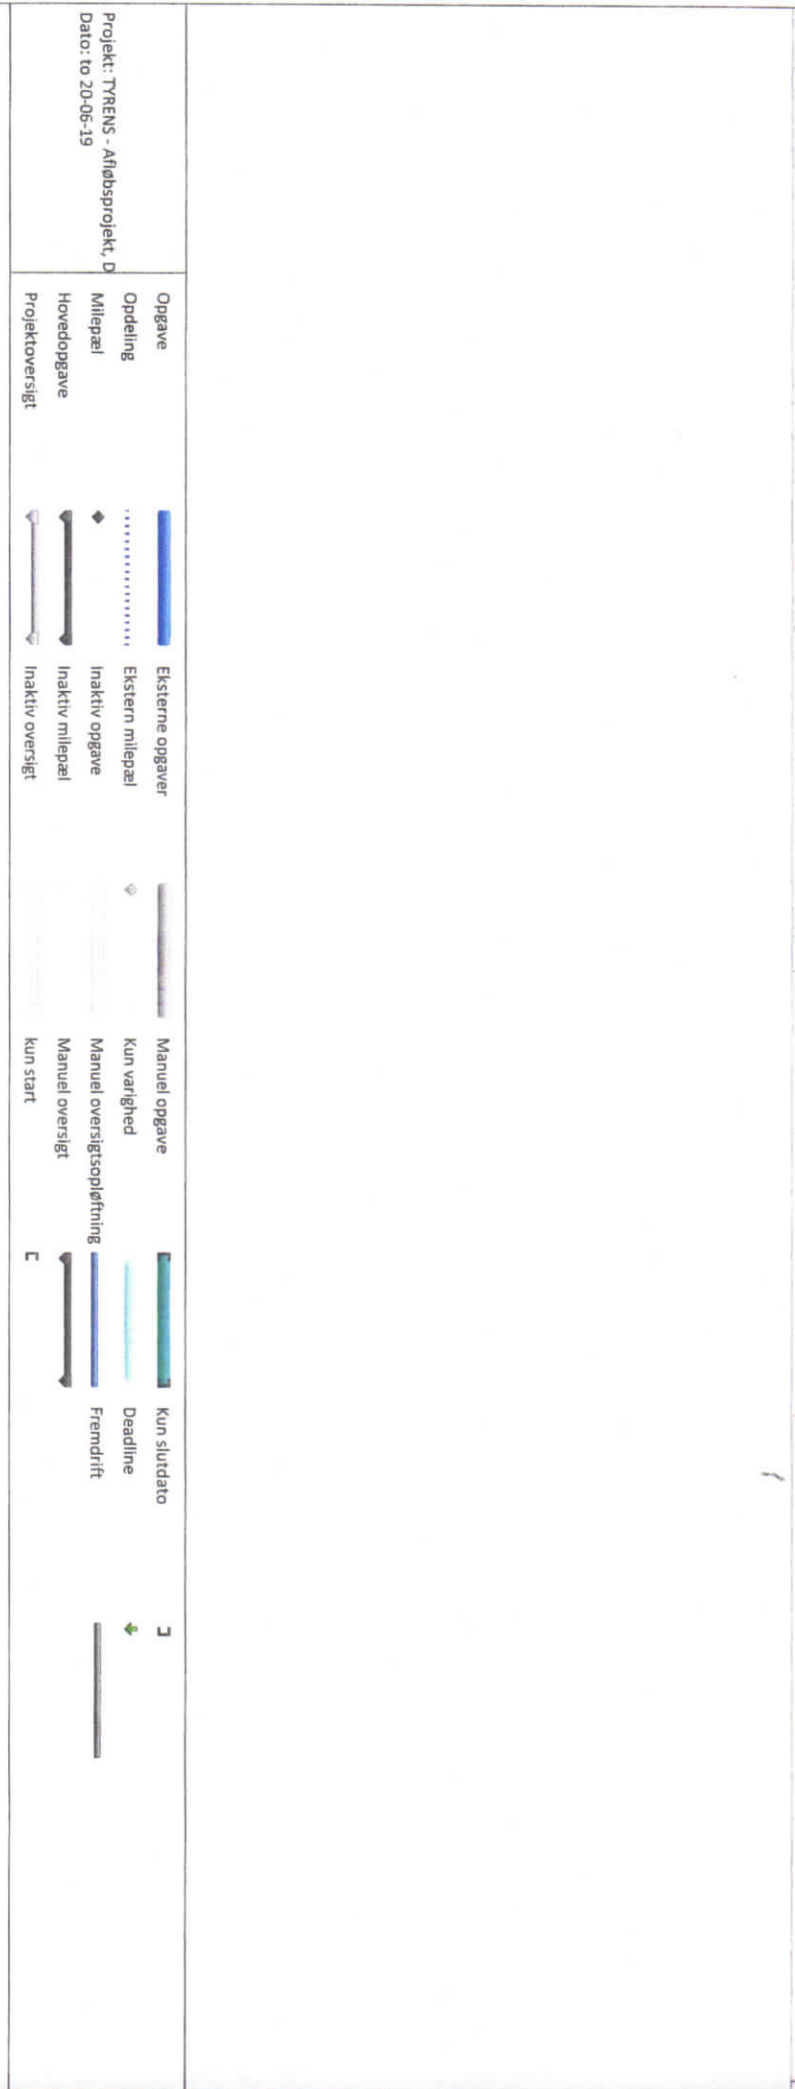

| Opgave | Eksterne opgaver |
|-----------------|------------------|
| Opdeling | |
| Milepæl | ◆ |
| Hovedopgave | ▬ |
| Projektoversigt | ▬ |

| Opgave | Manuel opgave | Kun slurdato |
|-----------------|---------------|--------------|
| Opdeling | ◆ | ↓ |
| Milepæl | ▬ | ▬ |
| Hovedopgave | ▬ | ▬ |
| Projektoversigt | ▬ | ▬ |
